







Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	



Adres(sen) MDU Graaf dUrsellaan 3 8301 Knokke-Heist

Secundaire adressen



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	

# 1. Algemene informatie:

Datum siteonderzoek	21-11-2019	Versie	1	Datum dos	ssier : 21-11-2019	
Verantwoordelijke Proximus	Renzo Scheld 080017372 glasvezel.kno		ıs.com			
Naam van het gebouw (ref syndic)						
Aantal eenheden (LU/BU/SU)	Total:9	LU:7			BU:1	SU:1
Aantal verdiepingen (RDC + x)	8					
Quadrant	А					

# 2. Informatie Syndic – VME – Eigenaar(s)

Syndic	Immo Holiday
Contact	
Email	beheer@immoholiday.be
Telefoon	050530104

### 3. Aanwezig bij het bezoek

Naam	Bedrijf	Email	Telefoon
Yannick_ Lambrechts		Yannick@keen-wise.be	



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	

# 4. Info Fiberhood - kadaster - IFH

Naam	Reference
Fiberhood	W03-C-Knokke-Heist-FH09
Block	
MDU LAMkey – IFH	2766964
Geplande distributie	Underground

### 5. Afbeelding – gevel en straat

Façade	Details	Ja/Nee
Karaktergevel		Nee
Aanwezigheid van elektriciteitskabels		Nee
Aanwezigheid van coaxkabels		Nee
Aanwezigheid van coaxiale multitaps		Nee
Aanwezigheid van openbare verlichting		Nee
Opmerkingen		
Straat	Details	Ja/Nee
Straatmeubilair		Ja
Gevelobstakels		Nee
Opmerkingen		

### 6. Bestaande telecominstallaties

Type verdeler :		Oud			
Installatie:	HDPE	LASBOX	FIBRE	RACK	SUBDUCT
	0	0	0	0	0
Technische schachten:	achten: JA/NEE		Toegankelijk JA/NEE		
Vertical		Nee		Nee	
Horizontal		Nee		Nee	
Elektriciteit		Nee		Nee	
Details (Cabine HT etc.)		In de kelder is de beste plaats voor de bd		dfo	
Beschikbare ruimte voo	r apparatuur	Nee			

CDF		Bestaande verticale kablering		COAX	
	Х		Х		Х
Krone blocks	0	Fiber	0	Multitaps (technische zaal)	Х
Siemens blocks	0	CAT5e of Cat6	0	Aantal (enkel tech zaal)	0
ADC modules	0	CAT3 of VVT	Х	Multitaps paliers	0
Vissés / Screwed	Х	Red-white jumper	0	Coax direct	0
Soudés / soldered	0	Cable plat / Flat cable	0	Anders/onbekend	0
Anders/onbekend	0	Anders/onbekend	0		

7.	Opmerkingen	



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	

# 8. Bestaande invoer – buiten-/ binnen aanzicht



Intro buiten



Intro binnen en traject naar huidige CDF.



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	



Huidige CDF, in de hal in de kast



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	

# 9. Toegang tot de MDU & Proximus-apparatuur


# Omschrijving



Sleutel te verkrijgen bij de syndicus. BDFO plaatsen in de kelder. Huidige CDF in de hal in de kast



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	

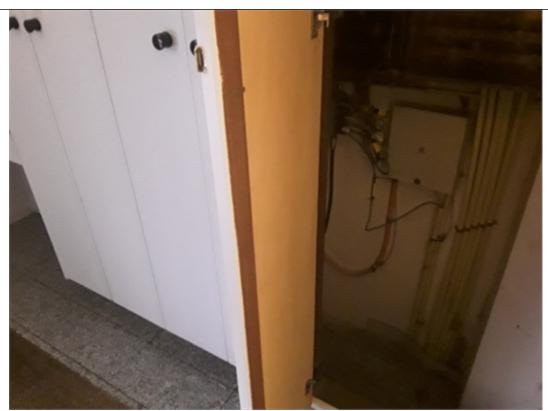

Huidige installatie in de hal. Geen plaats in de kast




Trap naar de kelder



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	



Kelder

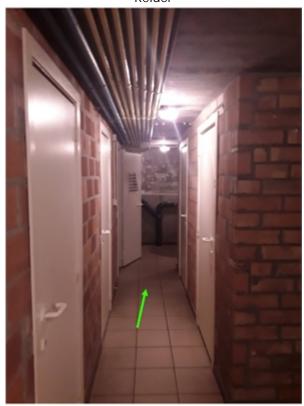

In het lokaal op het einde van de gang de BDFO plaatsen



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	

# 10. Bestaande situatie – foto's en schema's


Luchtfoto (Google):

# Foto's en schema's - Gevel





Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	

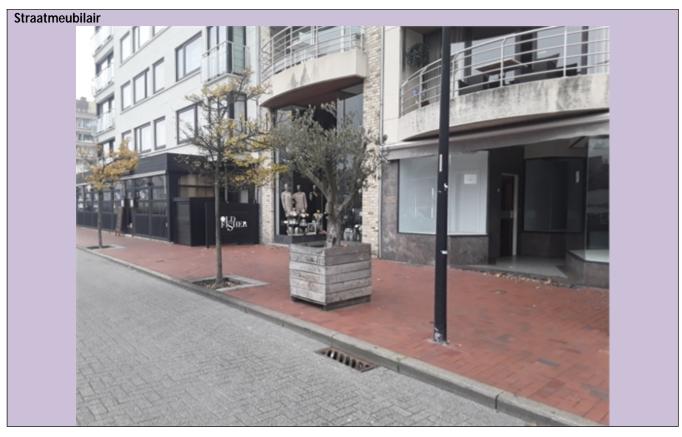





Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	

# Foto's en schema's - Technisch

# Technische ruimte

Intro buiten op de rooilijn



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	



Intro binnen en traject naar BDFO + traject van BDFO naar trappenhal



Traject naar trappenhal



Graaf dUrsellaan 3
8301 Knokke-Heist



Traject naar trappenhal



Traject naar trappenhal



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	



Traject naar trappenhal



Aansluiting lift. Boring naar gelijkvloers



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	



Glv. 1 aansluiting voor bu. Kabelgoot plaatsen

# Technische schacht / trappenhuis / verticale kolom



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	



1ste tem 6de 1 aansluiting voor lu. Kabelgoot plaatsen



Graaf dUrsellaan		3
8301	Knokke-Heist	



7. 1 lu kabelgoot plaatsen



MDU Site Survey Report

Details eenheden - LU / BU / SU										
Bus	Blok	Verdiep	# Eenheid	Opmerkingen	UTAC	Type (LU/BU /SU)	Bewoners	Tel / GSM	email	
		-1		Lift		SU				
01		0		Winkel		BU				
11		1				LU				
21		2				LU				
31		3				LU				
41		4				LU				
51		5				LU				
61		6				LU				
71		7				LU				



Graaf dUrsellaan	3	
8301	Knokke-Heist	
