







Zeedijk-Heist		190
8301	Knokke-Heist	



Adres(sen) MDU Zeedijk-Heist 190 8301 Knokke-Heist

Secundaire adressen



Zeedijk-Heist		190
8301	Knokke-Heist	

### 1. Algemene informatie:

Datum siteonderzoek	26-11-2019	Versie	1	Datum dos	ssier : 26-11-2019	
Verantwoordelijke Proximus	Renzo Scheldeman 080017119 glasvezel.knokke@proximus.com					
Naam van het gebouw (ref syndic)						
Aantal eenheden (LU/BU/SU)	Total:21	LU:20			BU:0	SU:1
Aantal verdiepingen (RDC + x)	10					
Quadrant	A					

# 2. Informatie Syndic - VME - Eigenaar(s)

Syndic	Dieter De Maeseneire
Contact	
Email	
Telefoon	050628880

### 3. Aanwezig bij het bezoek

Naam	Bedrijf	Email	Telefoon
Wim Lambrechts		wim.keenandwise@gmail.com	



Zeedijk-Heist		190
8301	Knokke-Heist	

## 4. Info Fiberhood - kadaster - IFH

Naam	Reference
Fiberhood	W03-C-Knokke-Heist-FH09
Block	
MDU LAMkey – IFH	1491084
Geplande distributie	Underground

### 5. Afbeelding – gevel en straat

Façade	Details	Ja/Nee
Karaktergevel		Nee
Aanwezigheid van elektriciteitskabels		Nee
Aanwezigheid van coaxkabels		Nee
Aanwezigheid van coaxiale multitaps		Nee
Aanwezigheid van openbare verlichting		Nee
Opmerkingen		
Straat	Details	Ja/Nee
Straatmeubilair		Nee
Gevelobstakels		Nee
Opmerkingen		

### 6. Bestaande telecominstallaties

Type verdeler :		Oud			
Installatie:	HDPE	LASBOX	FIBRE	RACK	SUBDUCT
	0	0	0	0	0
Technische schachten :		JA/NEE		Toegankelijk JA/NEE	
Vertical	ertical Nee			Nee	
Horizontal		Nee		Nee	
Elektriciteit		Nee Nee			
Details (Cabine HT etc.)					
Beschikbare ruimte voo	r apparatuur			Nee	

CDF		Bestaande verticale kablering		COAX	
	Х		Х		Х
Krone blocks	0	Fiber	0	Multitaps (technische zaal)	0
Siemens blocks	0	CAT5e of Cat6	0	Aantal (enkel tech zaal)	0
ADC modules	0	CAT3 of VVT	Х	Multitaps paliers	0
Vissés / Screwed	Х	Red-white jumper	0	Coax direct	0
Soudés / soldered	0	Cable plat / Flat cable	0	Anders/onbekend	Х
Anders/onbekend	0	Anders/onbekend	0		

7.	Opmerkingen	



Zeedijk-Heist		190
8301	Knokke-Heist	

### 8. Bestaande invoer – buiten-/ binnen aanzicht



Intro buiten



Intro binnen en route naar CDF.



Zeedijk-Heist		190
8301	Knokke-Heist	

# 9. Toegang tot de MDU & Proximus-apparatuur

# Omschrijving

Installatie en intro bevinden zich in de kelder tegen de straatkant.



Trap naar beneden.



Zeedijk-Heist	190	
8301	Knokke-Heist	



Voorbij de lift naar rechts.





Zeedijk-Heist	190	
8301	Knokke-Heist	

# 10. Bestaande situatie – foto's en schema's


Luchtfoto (Google):

## Foto's en schema's - Gevel





Zeedijk-Heist		190
8301	Knokke-Heist	

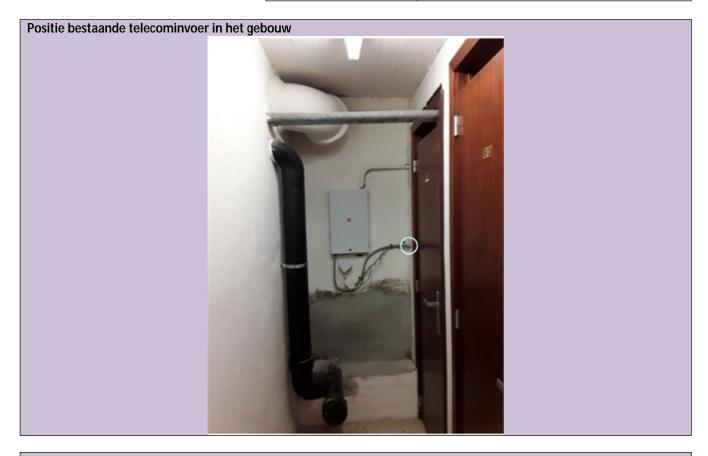



Zeedijk-Heist	190	
8301	Knokke-Heist	

## Foto's en schema's - Technisch

## Technische ruimte





Route van bdfo naar de lift waar de kabel omhoog zal gaan. Floorbox op -1 voor aansluiten lift.



Zeedijk-Heist	190	
8301	Knokke-Heist	




Op einde van de gang bocht naar links voor uit te komen aan de lift -1.



Horizontale boring maken om tot bij de lift te geraken. Vervolgens gaat de kabelweg naar boven aan de rechterkant van de lift.



Zeedijk-Heist	190	
8301	Knokke-Heist	

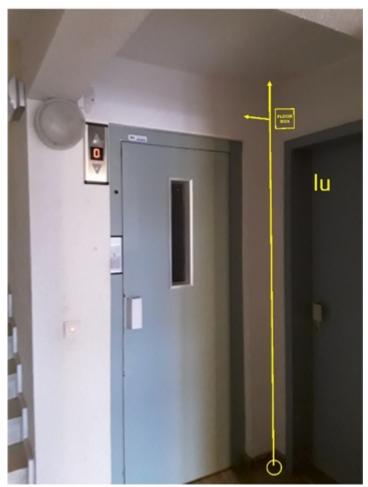

Gelijkvloers 2 lu.



Zeedijk-Heist	190	
8301	Knokke-Heist	



Alle verdiepingen hebben dezelfde indeling. Van 1 tot en met 9, 2 lu per verdieping.



MDU Site Survey Report

Detai	Details eenheden - LU / BU / SU								
Bus	Blok	Verdiep	# Eenheid	Opmerkingen	UTAC	Type (LU/BU /SU)	Bewoners	Tel / GSM	email
		-1	1			SU			
		0	1			LU			
		0	2			LU			
		1	1			LU			
		1	2			LU			
		2	1			LU			
		2	2			LU			
		3	1			LU			
		3	2			LU			
		4	1			LU			
		4	2			LU			
		5	1			LU			
		5	2			LU			
		6	1			LU			
		6	2			LU			
		7	1			LU			
		7	2			LU			
		8	1			LU			
		8	2			LU			
		9	I			LU			
		9	2			LU			



Zeedijk-Heist	190	
8301	Knokke-Heist	
